



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CNPJ N.º 45.152.139/0001-99


Emancipado em 28/10/1917

## DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS


Folha

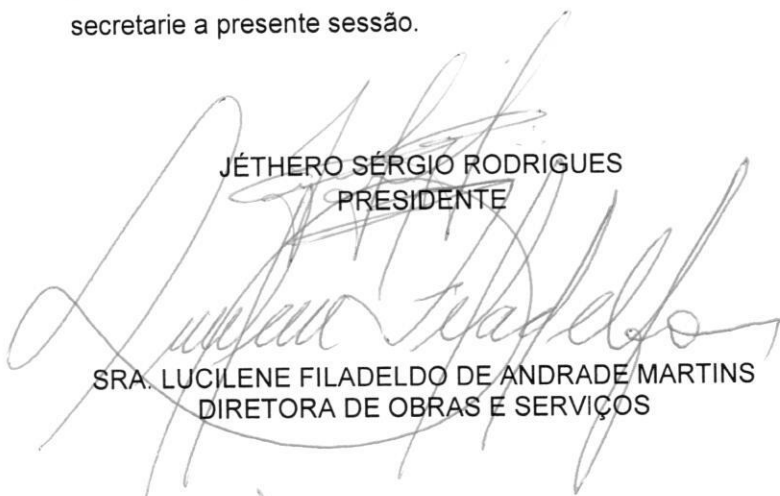
Nº

### ATA DA REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA PARA ELUCIDAR DUVIDAS QUANTO AO ANDAMENTO DAS OBRAS INERENTES A CONCORRÊNCIA N.º. 006/2015 CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º. 136/2015.

Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 10h30min, no prédio do Paço Municipal, Divisão de licitações e Contratos, situado à Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho, nº 185, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº. 60/15, de 05 de agosto de 2015, pelo senhor Prefeito Municipal em exercício, **DR. TOSHIO TOYOTA**, composta pelos membros: **JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES**, **DAVID CARNEVALI PIMENTEL** e **VICTOR FONSECA BILLER**, todos servidores desta municipalidade, a Diretora de Obras e Serviços Públicos, **SRA. LUCILENE FILADELDO DE ANDRADE MARTINS**, e Engenheiro **JOSÉ FERNANDO SPIR**, sendo representante da empresa contratada **CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA**, os Srs. **LUIS ALONSO** e **CLAUDINEIS JOSE DA SILVA**, com a finalidade de se obter **justificativa técnica para as razões do atraso no cronograma físico financeiro da obra**. Aberto os trabalhos a Sra. Lucilene questionou aos representantes quanto ao atraso no cumprimento do Cronograma Físico/Financeiro da Obra. O Sr. Claudineis informou que estava aguardando esta reunião para poder explicar a situação financeira da obra. Segundo informa o atraso no pagamento das parcelas executadas está dificultando o andamento das obras. Basta observar que a última Nota Fiscal emitida data de 14 de outubro de 2016 e até a presente data não foi paga, sendo que consta do contrato que após medição, restariam 10 dias para o pagamento. A Sra. Lucilene solicita para que as medições constem apenas o realmente executado, do contrário não poderá autorizar o pagamento. O Sr. Jose Fernando orientou para que fosse glosado etapa não realizadas e pago somente aquela efetivamente concluída. Informa ainda que sobre o andamento das medições está previsto na planilha orçamentaria o BDI. O Sr. Claudineis pediu a colaboração dos responsáveis para que o pagamento ocorra dentro do contratado, desta forma não ocorreria mais problemas, se comprometendo a trazer nova equipe de mão de obra para continuidade dos serviços. Nada mais havendo, que se fizesse digno de menção lavrou-se a presente ata que vai abaixo assinada por todos os presentes. Eu Jéthero Sergio Rodrigues  secretarie a presente sessão.

  
JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES  
PRÉSIDENTE

  
DAVID CARNEVALI PIMENTEL  
MEMBRO

  
SRA. LUCILENE FILADELDO DE ANDRADE MARTINS  
DIRETORA DE OBRAS E SERVIÇOS

  
VICTOR FONSECA BILLER  
MEMBRO

  
SR. LUIS ALONSO  
CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA

  
SR. CLAUDINEIS JOSE DA SILVA  
CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA
